

文件编号	/	更新日期	2023 年 9 月 6 日	文件类别	工作流程
拟文人	苗金丹	流程制定部门	COO office	存档地	SharePoint/Everyone
收文人	BMO、BD&销售、售前（含策划）、PM、DMP		附件	见文中附件处	
抄送	COO				
☐ 传阅	☐ 阅后存档	☐ 保密/期限	☐ 其他	☒ 页数：4 页	

项目管理流程

一、目的

规范 DataMesh 项目执行流程，规范项目的管理方式，明确各阶段的任务和责任，提高项目管理的效率和质量。

二、适用范围


DataMesh 所有项目执行流程。包括<标准产品/（产品+标准内容）>、<定制交付/（产品+非标准内容）>。需注意具体执行流程节点可根据项目实际情况合理裁剪。

三、角色和职责

- BD、Sales: 主要负责按照客户的具体需求提交立项、合同签署
- BMO: 负责组织商机 Review、成单预测率高于80%的定制类项目资源配置提审
- PMO: 主要负责立项审核、项目经理指派、资源协调、项目集过程监控、项目复盘组织过程资产积累
- 售前: 主要负责客户需求确认、售前方案输出、技术协议确定、成本评估等
- 项目: 主要负责项目成本评估、交付时间/质量/成本/范围把控、确保项目成功交付
- 项目委员会: 对申请立项项目进行综合审批，包括成本预估/技术评估/风险评估等。项目委员会启用方式为：提报申请给BMO，由BMO向项目委员会汇报或发起委员会讨论

四、流程图和控制描述

1、标准产品/（产品+标准内容）

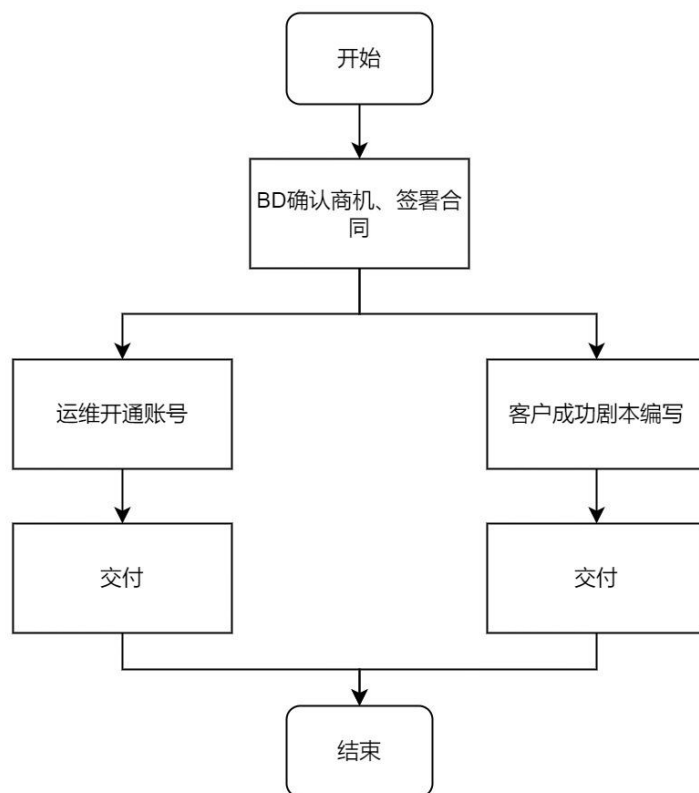

2、定制交付/（产品+非标准内容）

[illegible]

- ❖ 执行过程说明：项目执行阶段涉及到 DMP 产品研发流程及产出质量标准需严格按照 Release 部裁剪的过程去执行《DMP 部门管理制度 V1.0》。

如其中涉及到计划、进度、质量、成本、变更，映射到项目执行中：

- 原则上先做计划，通过计划分配资源，项目执行中私自更改计划安排或有计划问题的，具体措施或反馈详见“三、部门流程管理规范/流程管理要求/计划管理要求”1.9。
- 项目执行中出现因进度问题导致的影响交付工期的，具体措施或反馈详见“三、部门流程管理规范/流程管理要求/进度管理要求”2.8，2.9。
- DMP 团队的所有工作任务，在做最终交付时，默认是经过自查/自测交付物的质量，如交付物质量存在问题或不达标具体措施或反馈详见“三、部门流程管理规范/流程管理要求/质量管理要求”3.5，3.6，3.7。
- 执行工作任务的成本，团队所有成员都要有成本控制意识，需及时关注预计和实际工时填写，措施或反馈详见“三、部门流程管理规范/流程管理要求/成本管理要求”4.5；项目绩效奖金核算需要根据项目中的贡献度匹配核算，项目小组成员考核指标包括不限于标准工时、工作态度和工作技能等。
- 项目中如果出现“项目镀金”和“范围蔓延”，措施或反馈详见“三、部门流程管理规范/流程管理要求/变更管理要求”5.2，5.3，5.4，5.5。

五、附件

- 《项目备案邮件模板》.docx，路径见 SharePoint/Everyone/PMO
- 1008-《XX 立项申请书》.xlsx，路径见 SharePoint/Everyone/PMO
- 其他项目执行过程文件，路径见 SharePoint PM/文档/005-实施方法论 V1.0
- 《DMP 部门管理制度 V1.0》，路径见 SharePoint/Everyone
- 《CRM(PRO) 商机管理流程》，路径见 SharePoint/DataMesh Sales（待发布）
- 《项目管理流程图 V1.0》，路径见 SharePoint/Everyone/PMO

六、流程版本更新记录

版本号	更新日期	拟文	审核	审批
V1.0	2023年9月6日	苗金丹	刘晶	Niki
